




MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE

PER LA MARINA DI ANCONA

Lavori di “DEMOLIZIONE DEI CORPI B, C ed Ex-Magazzino Elettricisti” - Caserma Fazioli - Borgo Rodi - Ancona
ID 8260 - Cap. 7120-28/SMM - EF 2024 – CE 033323.

PROGETTO ESECUTIVO

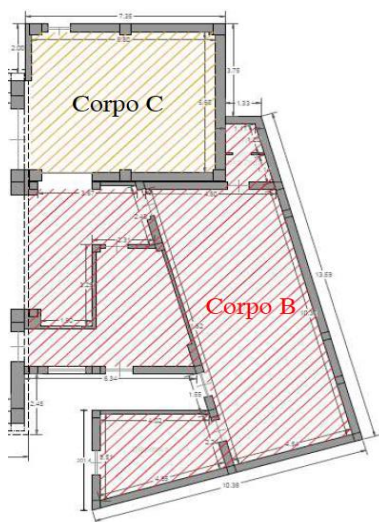

DISCIPLINA:
ELABORATI SICUREZZA

DESCRIZIONE:
**CRONOPROGRAMMA DELLE
ATTIVITA' GANTT**

TAVOLA:
SIC-02

SCALA:

DATA:
14 giugno 2024

PROGETTISTA:
Ing. PAOLO CLEMENTE

Ing. Andrea MILILLO

ENERGY EDIL ENGINEERING
ENERGIE RINNOVABILI - EDILIZIA ECOSOSTENIBILE - EFFICIENZA ENERGETICA



Sede legale: Via De Gasperi, 70 – 60125 Ancona
Tel. 071.2804027/071.82442 – Fax 071.2812459
Web: www.energyedil.it
E-mail: progetti@energyedil.it
C.F.-P. IVA: 02532930423

 **ENERGY EDIL ENGINEERING s.r.l.**
Via De Gasperi, 70
60125 ANCONA
Cod. F./P. IVA 02532930423

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

REVISIONE

DATA

RIFERIMENTO REVISIONE

01

14 giugno 2024

Perizia di variante

ALLEGATO "A"

Comune di Ancona
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: DEMOLIZIONE CORPO C, B e Magazzino Elettricisti_ - Caserma Fazioli - Borgo Rodi - Ancona

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA-SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA.

CANTIERE: via Rodi, Ancona (AN)

Ancona, 27/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Milillo Andrea)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(R.U.P. di Michele Michele)

ingegnere Milillo Andrea

C.so Mazzini 64
60100 Ancona (An)
Tel.: 3295790433 - Fax: \\
E-Mail: andrea_milillo@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

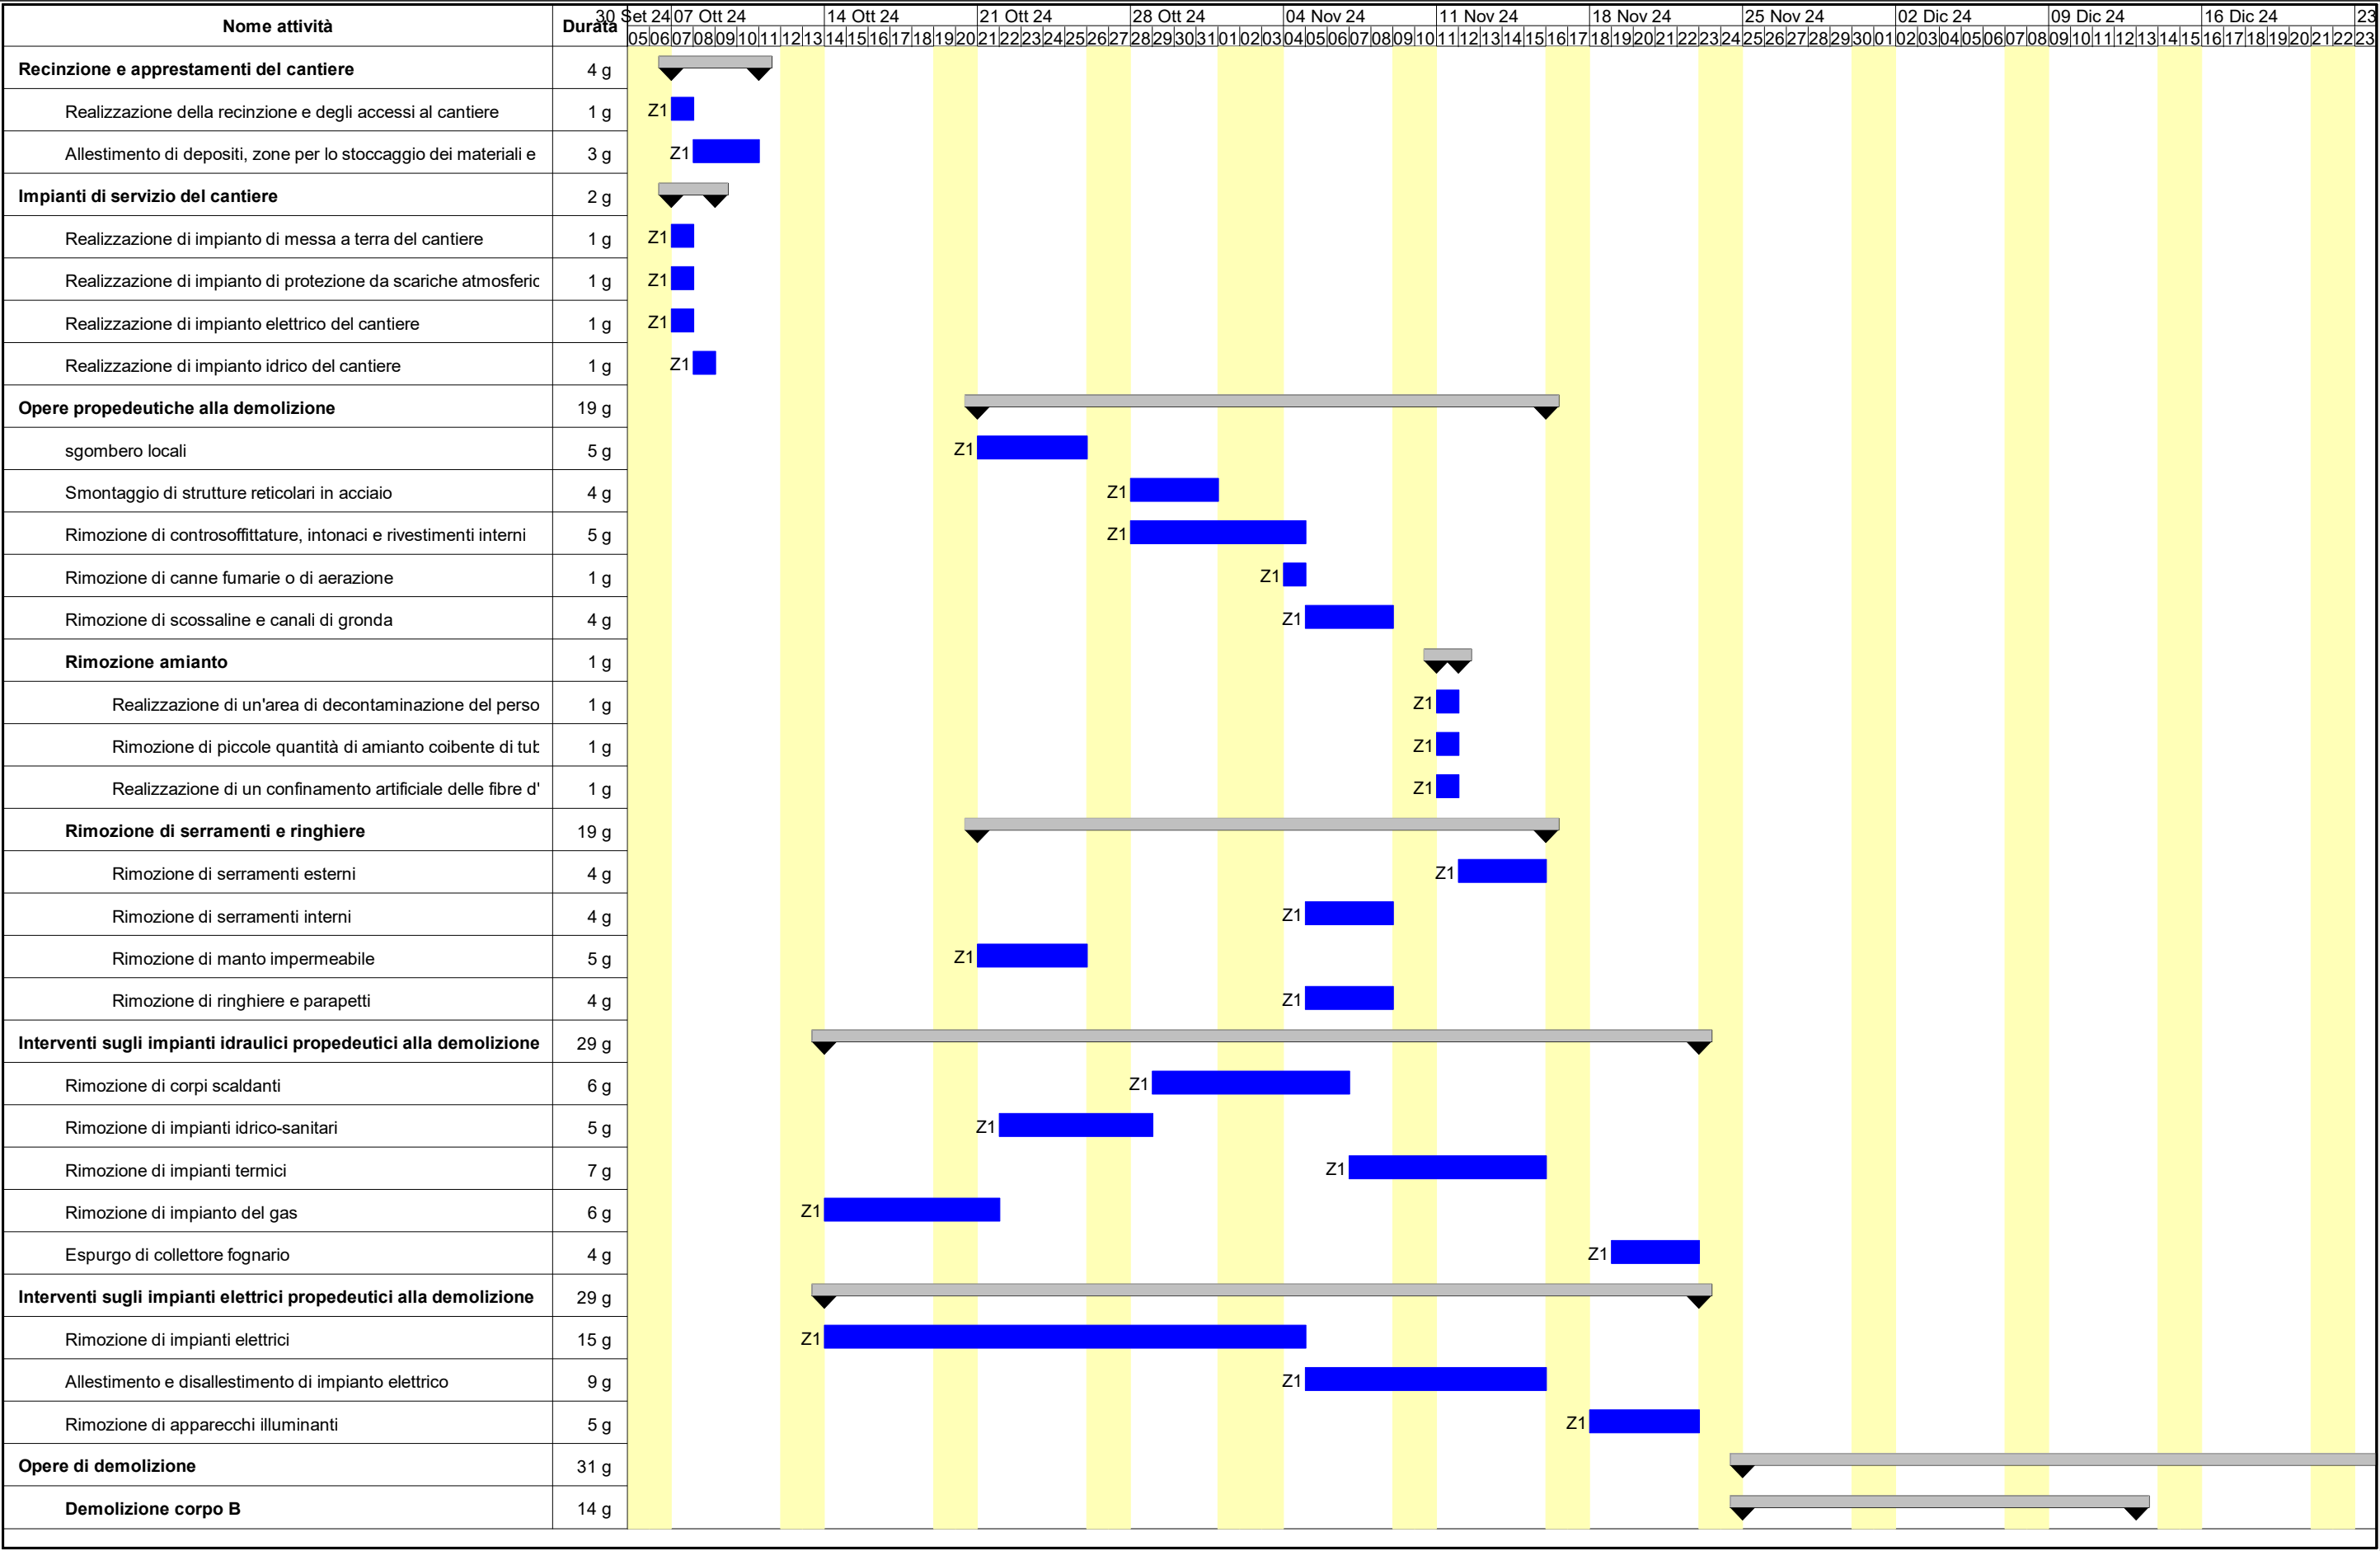

Nome attività	Durata	30 Set 24	07 Ott 24	14 Ott 24	21 Ott 24	28 Ott 24	04 Nov 24	11 Nov 24	18 Nov 24	25 Nov 24	02 Dic 24	09 Dic 24	16 Dic 24	23						
		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n	14 g									Z1										
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	4 g											Z1								
Demolizione magazzinoi elettricisti	9 g																			
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n	9 g																			
Demolizione corpo C	17 g																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso	4 g											Z1								
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n	9 g																			
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																			
Demolizione fondazioni	4 g																			
Scavo eseguito con martello demolitore	4 g																			
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi mec	4 g																			
Opere edili di ripristino	39 g																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																			
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g																			
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne	5 g																			
Trattamento antiossidante di armature esterne	3 g																			
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	5 g																			
Taglio di muratura a tutto spessore	5 g																			
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g																			
Rimozione di massetto	3 g																			
Realizzazione di murature in elevazione	5 g																			
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g																			
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g																			
Montaggio di porte per esterni	3 g																			
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																			
Formazione di fondazione stradale	10 g																			
Posa di ringhiere e parapetti	4 g																			
Opere idrauliche di ripristino	15 g																			
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	15 g																			
Opere elettriche di ripristino	15 g																			
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di	10 g																			
Installazione di gruppo elettrogeno fisso	10 g																			
Smobilizzo del cantiere	13 g																			
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																			
Smobilizzo del cantiere	3 g																			

23	Dic 24			30 Dic 24			06 Gen 25			13 Gen 25			20 Gen 25			27 Gen 25			03 Feb 25			10 Feb 25			17 Feb 25			24 Feb 25			03 Mar 25			10 Mar 25			17 Mar 25			24 Mar 25			31 Mar 25			07 Apr 25																														
	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
