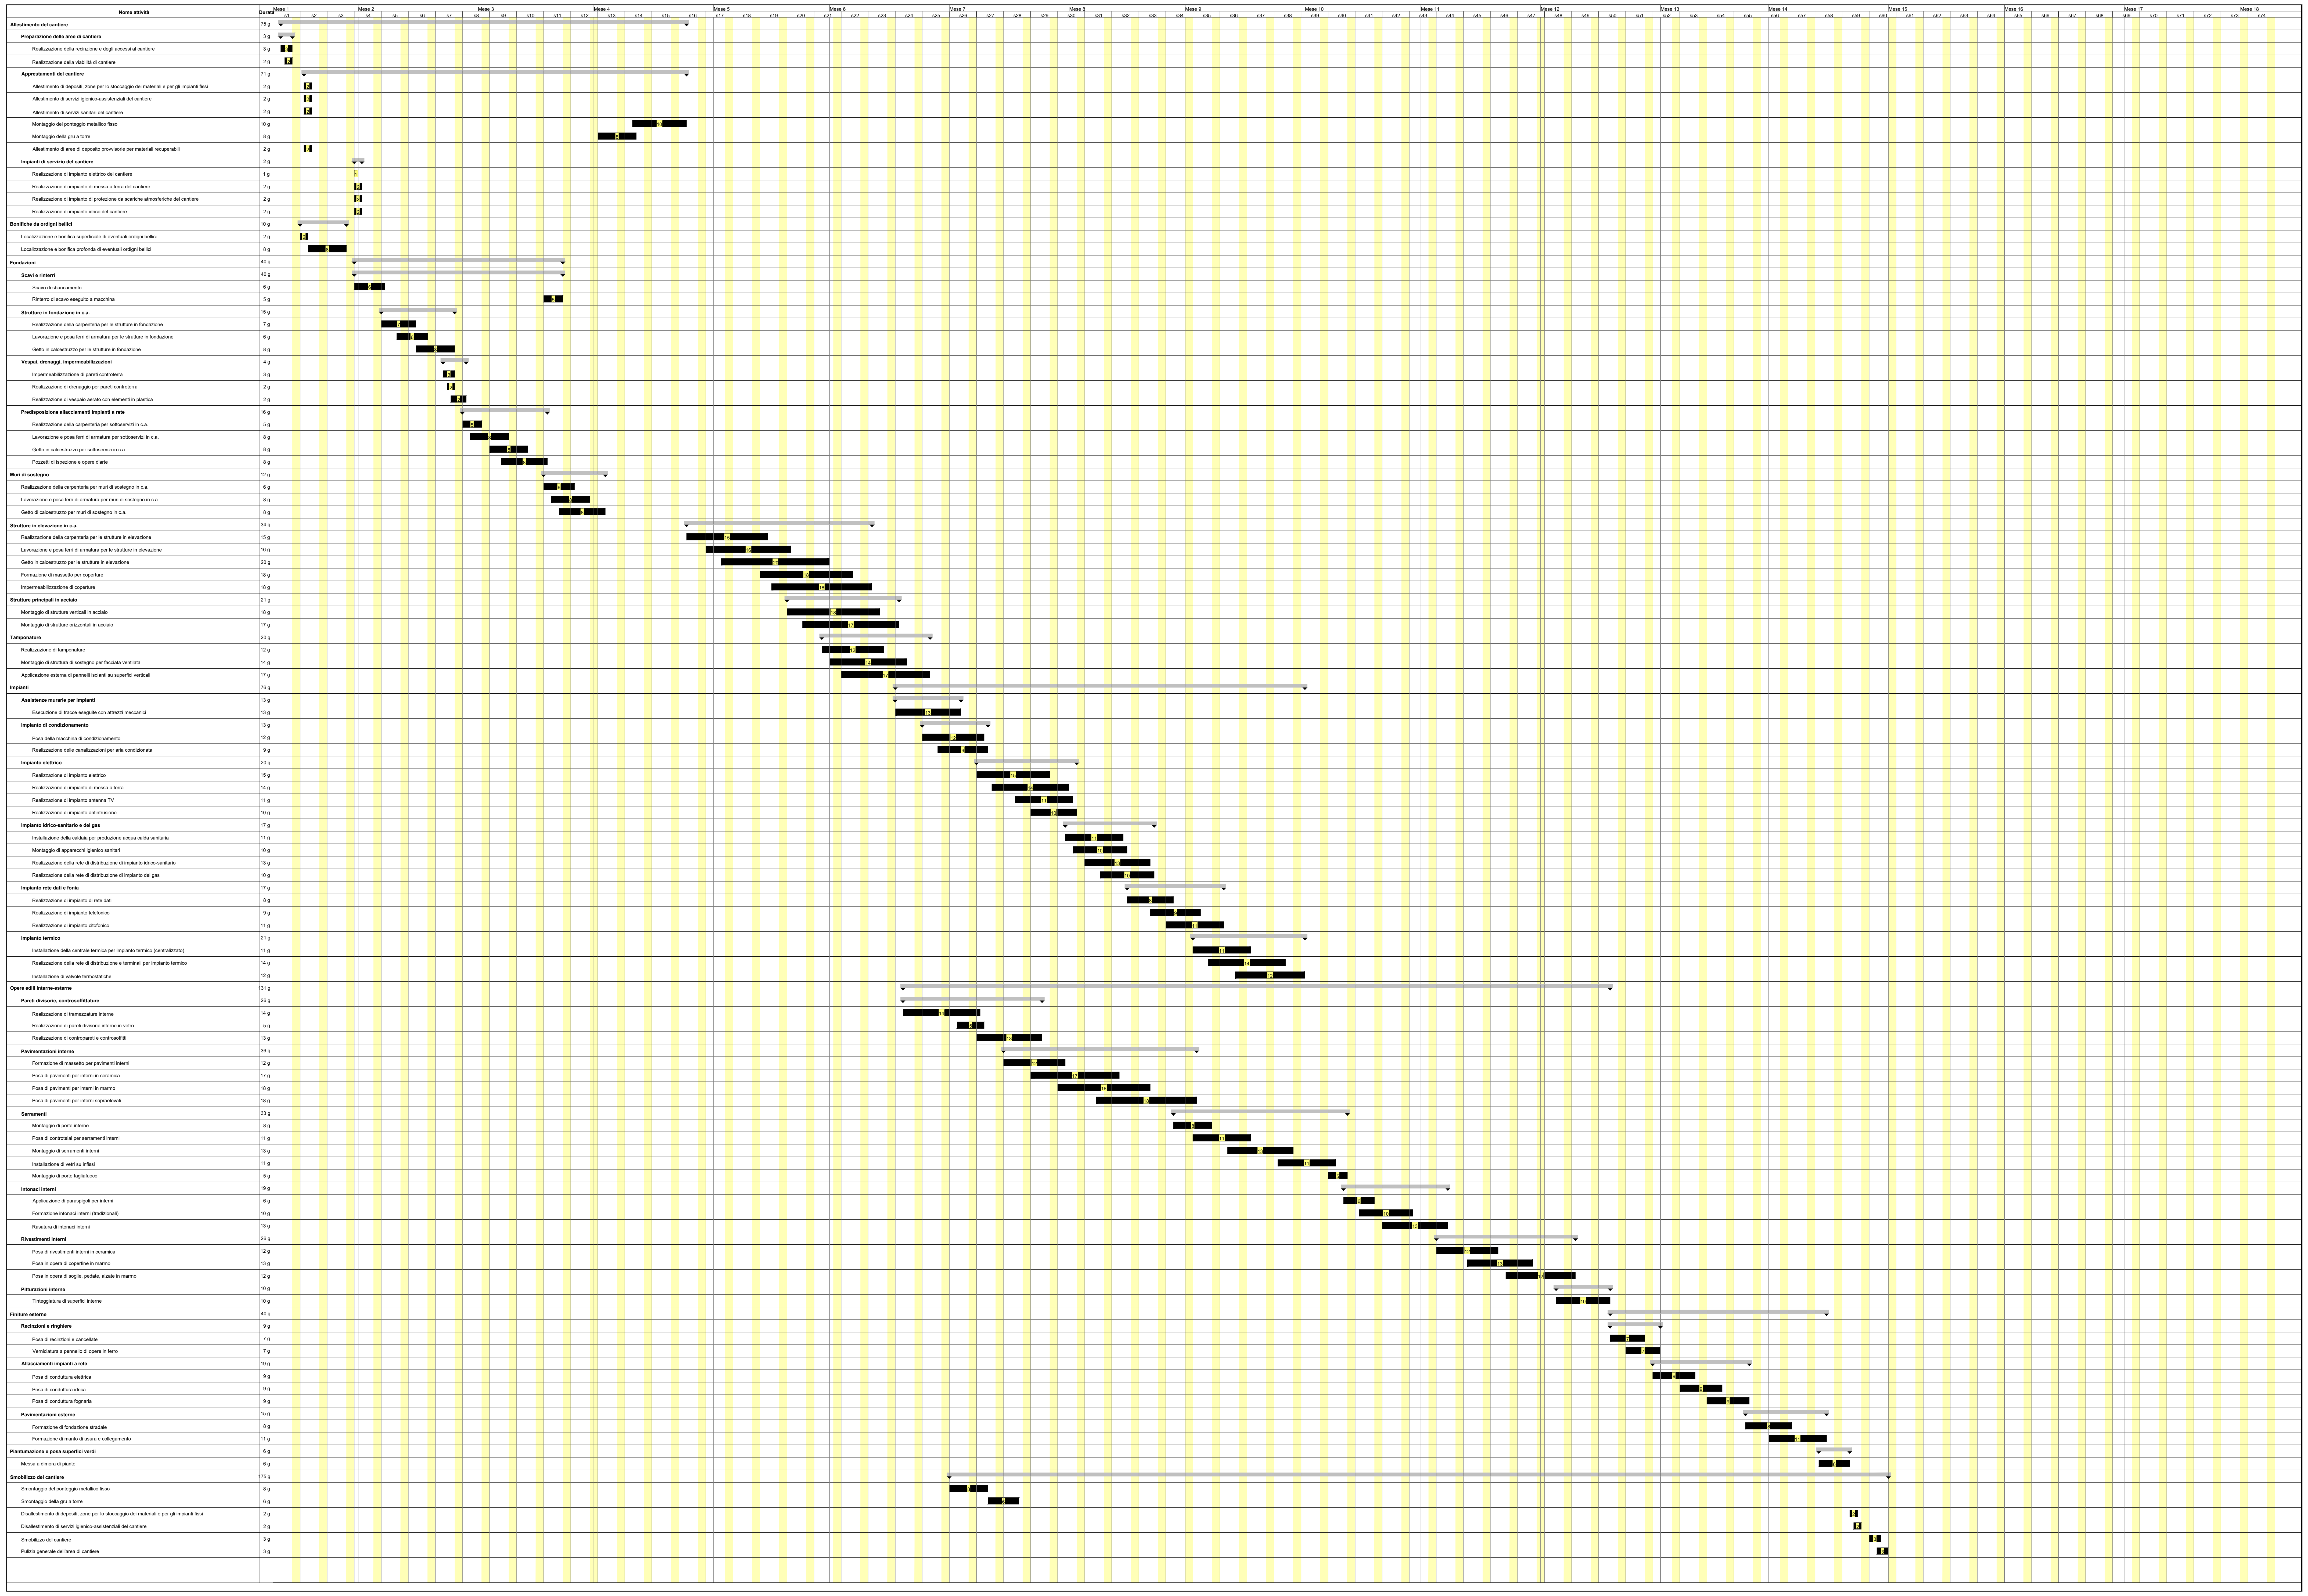

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	75 g
Preparazione delle aree di cantiere	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g
Apprestamenti del cantiere	71 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	10 g
Montaggio della gru a torre	8 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	2 g
Impianti di servizio del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Bonifiche da ordigni bellici	10 g
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	2 g
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	8 g
Fondazioni	40 g
Scavi e rinterri	40 g
Scavo di sbancamento	6 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Strutture in fondazione in c.a.	15 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	6 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	8 g
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni	4 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	3 g
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	2 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	2 g
Predisposizione allacciamenti impianti a rete	16 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	8 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	8 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	8 g
Muri di sostegno	12 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	8 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	8 g
Strutture in elevazione in c.a.	34 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	15 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	16 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	20 g
Formazione di massetto per coperture	18 g
Impermeabilizzazione di coperture	18 g
Strutture principali in acciaio	21 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	18 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	17 g
Tamponature	20 g
Realizzazione di tamponature	12 g
Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata	14 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	17 g
Impianti	76 g
Assistenze murarie per impianti	13 g
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	13 g
Impianto di condizionamento	13 g
Posa della macchina di condizionamento	12 g
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	9 g
Impianto elettrico	20 g
Realizzazione di impianto elettrico	15 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	14 g
Realizzazione di impianto antenna TV	11 g
Realizzazione di impianto antintrusione	10 g
Impianto idrico-sanitario e del gas	17 g
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	11 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	10 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	13 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	10 g
Impianto rete dati e fonia	17 g
Realizzazione di impianto di rete dati	8 g
Realizzazione di impianto telefonico	9 g
Realizzazione di impianto citofonico	11 g
Impianto termico	21 g
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	11 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	14 g
Installazione di valvole termostatiche	12 g
Opere edili interne-esterne	131 g
Pareti divisorie, controsoffittature	26 g
Realizzazione di tramezzature interne	14 g
Realizzazione di pareti divisorie interne in vetro	5 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	13 g
Pavimentazioni interne	36 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	12 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	17 g
Posa di pavimenti per interni in marmo	18 g
Posa di pavimenti per interni sopraelevati	18 g
Serramenti	33 g
Montaggio di porte interne	8 g
Posa di controtelai per serramenti interni	11 g
Montaggio di serramenti interni	13 g
Installazione di vetri su infissi	11 g
Montaggio di porte tagliafuoco	5 g
Intonaci interni	19 g
Applicazione di paraspigoli per interni	6 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g
Rasatura di intonaci interni	13 g
Rivestimenti interni	26 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	12 g
Posa in opera di copertine in marmo	13 g
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	12 g
Pitturazioni interne	10 g
Tinteggiatura di superfici interne	10 g
Finiture esterne	40 g
Recinzioni e ringhiere	9 g
Posa di recinzioni e cancellate	7 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	7 g
Allacciamenti impianti a rete	19 g
Posa di conduttura elettrica	9 g
Posa di conduttura idrica	9 g
Posa di conduttura fognaria	9 g
Pavimentazioni esterne	15 g
Formazione di fondazione stradale	8 g
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g
Piantumazione e posa superfici verdi	6 g
Messa a dimora di piante	6 g
Smobilizzo del cantiere	175 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	8 g
Smontaggio della gru a torre	6 g
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A.
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
1° REPARTO 3° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - CENTRALE OPERATIVA CONTROLLO AEROMOBILI PRESSO L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

PROGETTO ESECUTIVO

IDENTIFICATIVO TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:	DATA
E-EG-D24	E-EG-D24_00.pdf	-	01.03.2024

PROGETTISTA INCARICATO:
ARCOMPROJECT
Via Venanzio Fortunato, 55 - 00136 Roma
t. +39.06.35344031 - f. +39.06.35401984
e-mail: info@arcomproject.com
www.arcomproject.com

CONSULENTI:
Strutture MP Ingegneria
Studio Tecnico Peroni
Via Carlo Linneo, 19, 00197 Roma RM
t.+39 06 321 0293

Impianti seingim
engineering made human
Viale Duca D'Aosta 67/6 30022 Ceggia, Venezia
t.+39 0421 323 007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V Luca Nocchetti

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Arch. Giancarlo Bertocchini

FASE	COD DISC	TIPO	NUM TAV	DESCRIZIONE
E	EG	D	24	CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT

REVISIONI		
1	RIEMISSIONE A SEGUITO VERIFICA	28/06/2024

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY
