N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	IMPORTO
1	ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE	3	4.039,64
2	Apposizione segnaletica	1	
3	Transennamento e recinzione area	1	
4	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	
5	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1	
6	CONSOLIDAMENTI INTRADOSSO SOLAIO	14	54.710,36
7	Puntellature	4	
8	Spicconatura calcestruzzo degradato	2	
9	Pulizia e trattamento delle armature	7	
10	Ripristino copriferro	9	
11	Pulizia ed allontamento rifiuti	1	
12	INTERVENTI IN COPERTURA	25	37.527,79
13	Montaggio ponteggio	2	
14	Rimozione manto copertura	2	
15	Demolizione di massetti	2	
16	Consolidamento di strutture con fibre di carbonio	8	
17	Esecuzione di massetti	1	
18	Intonaco tradizionale	2	
19	Impermeabilizzazione di coperure	3	
20	Pulizia ed allontamento rifiuti	1	
21	Montaggio canaline, scossaline, gronde e pluviali	1	
22	Montaggio linee vita su coperture	3	
23	PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO	5	12.516,84
24	Controsoffitti	5	
25	FOGNATURE	7	3.594,12
26	Taglio e demolizione pavimentazione	1	
27	Demolizione massicciata stradale	1	
28	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano	1	
29	Posa pozzetti prefabbricati	1	
30	Posa tubazioni di piccolo diametro	1	
31	Fondazione stradale	1	
32	Compattazione di rilevati o fondazioni stradali	1	
33	Finitura manto stradale	1	
34	Trasporto a rifiuto	1	
35	FINITURE ESTERNE	7	15.126,04
36	Spicconatura intonaco esterno	2	
37	Intonaco esterno	4	
38	Tinteggiature esterne	7	
39	OPERE IN PIETRA E MARMO	5	1.633,54
40	Restauro di marmi e pietre	4	
41	Trattamento protettivo paramenti in pietra	4	
42	SOSTITUZIONE INFISSI	1	850,28
43	Rimozione di infissi	1	
44	Posa in opera controtelai ed infissi esterni	1	
45	Opere di finitura	1	
46	SEGNALETICA INGRESSO M.M.	4	8.000,00
47	Impianto elettrico e di terra esterno	1	
48	Installazione di segnaletica luminosa	2	
49	Posa in opera di armatura di illuminazione	2	
50	RIMOZIONE CANTIERE EDILE	5	20.147,64
51	Smontaggio baracche	1	
52	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1	
53	Smontaggio ponteggio	2	
54	Smontaggio recinzione cantiere	1	

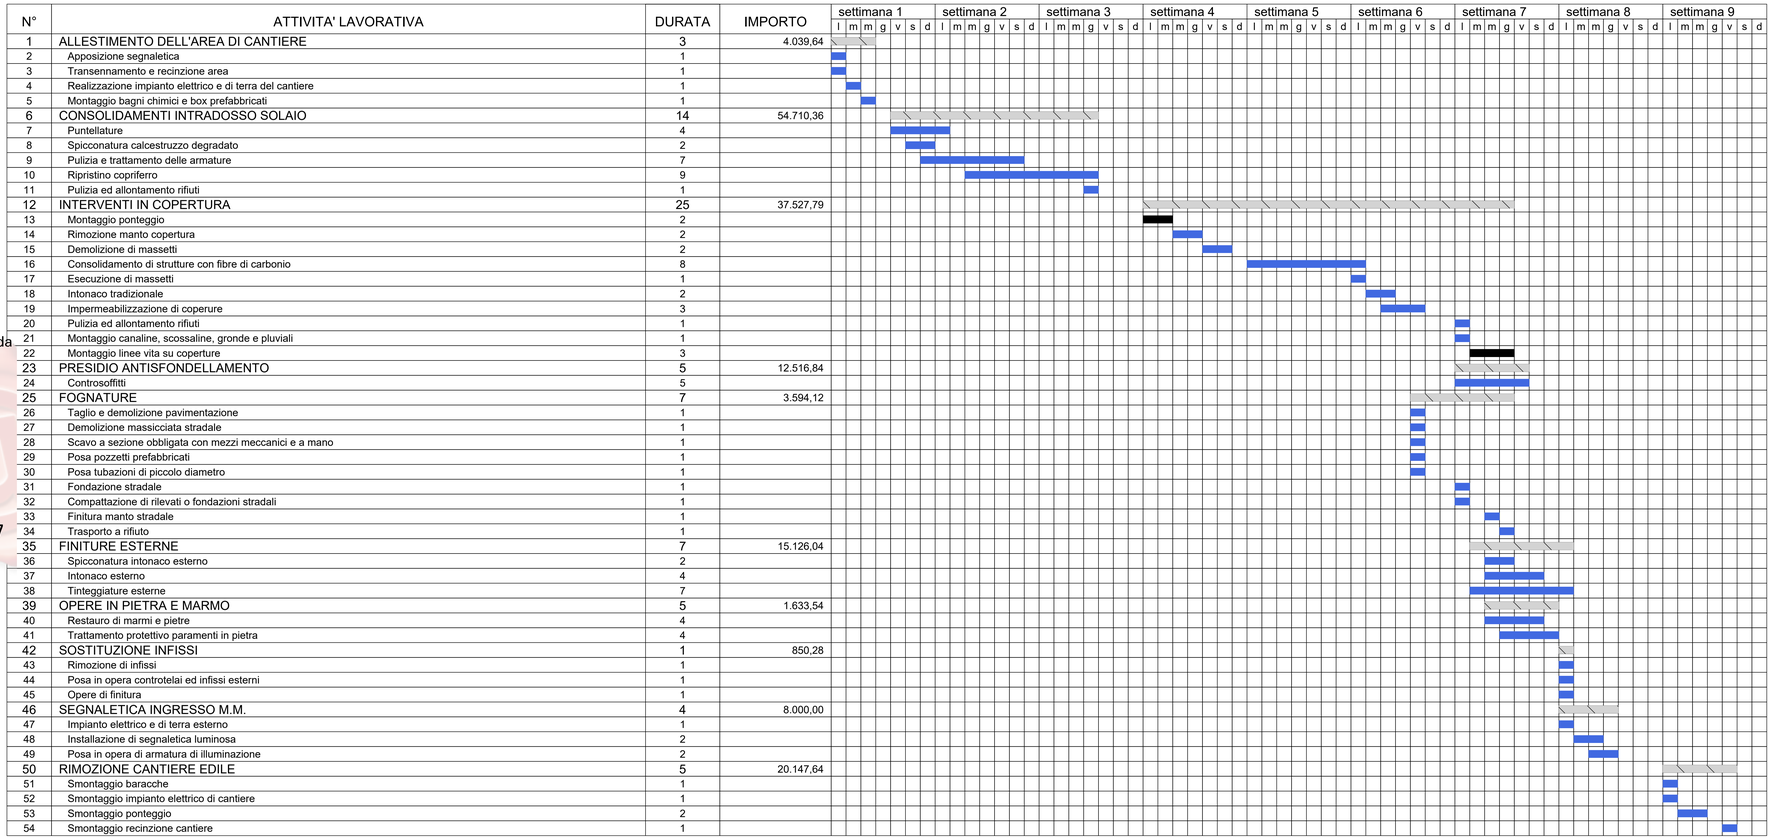

Firmato digitalmente da

nunziante vitale

O = Ordine Ingegneri Napoli
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-VTLNZN77E19B963Q
C = IT

LEGENDA ZONE

Zona unica

Direzione del Genio per la Marina Militare
TARANTO

Progettazione esecutiva comprensiva di PSC dei lavori di ripristino del solaio laterocementizio della pensilina d'ingresso del comprensorio di Nisida Napoli-ID2270 - CIG B18518CD7D

E.DE.07 Cronoprogramma.

Firmato digitalmente da
nunziante vitale
O = Ordine Ingegneri Napoli
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-VTLNZN77E19B963Q
C = IT

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
T.V. Andrea VALENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
C.C. Felice CIARAMELLA
